



CEDH

COMISIÓN ESTATAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS CHIHUAHUA

**PAGO, GENERADORES Y
ESTIMACIÓN No. 5**

ING. RAFAEL AMAYA TORAL

CALLE PINO 509-5, COL. GRANJAS C.P 31100, CHIHUAHUA, CHIH.

CHIHUAHUA, CH 20 DE AGOSTO DEL 2021

**C.P RAFAEL VALENZUELA LICÓN
SUPERVISOR DE OBRA**

**ANEXO ESTIMACION No. 5 (CINCO) CON FACTUR/ CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA :
TERMINACION DE LA OBRA RELATIVA A LA REMODELACION INTERIOR PARA OFICINAS DE LA COMISIÓN
ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN CHIHUAHUA CHIHUAHUA**

**DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DURANTE EL PERÍODO DE 20 DE AGOSTO DEL 2021 AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021
POR UN SALDO NETO FACTURADO DE \$137,805.48 CON IVA INCLUIDO**

**ACOMPAÑADA DE LOS NÚMEROS GENERADORES, FOTOGRAFIAS Y CROQUIS ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN
QUE ACREDITA LA PROCEDENCIA DE SU PAGO; PARA SU REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN**

ATENTAMENTE

ING RAFAEL AMAYA TORAL

RECIBE

C.P RAFAEL VALENZUELA LICÓN

EJEMPLO DE FACTURA

NOMBRE	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS	F A C T U R A
R.F.C.		
DOMICILIO	AV.ZARCO 2436	FECHA
CIUDAD	CHIHUAHUA, CHIH.	20 DE AGOSTO DEL 2021

CONCEPTO	PRECIO UNIT	CANTIDAD	IMPORTE
TERMINACION DE LA OBRA RELATIVA A LA REMODELACION INTERIOR PARA OFICINAS DE LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN CHIHUAHUA CHIHUAHUA			
ESTIMACION NUMERO	5 (CINCO)		
SEGÚN CONTRATO NUM. CEDH 001/2021			
FIRMA DEL CONTRATISTA			
ALCANCE DE LA ESTIMACION			\$ 118,797.83
AMORTIZACION DEL ANTICIPO			\$ -
SUMA		\$ -	
		\$ -	
NETO A RECIBIR		\$ 137,805.48	

CON LETRA: (CIENTO TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCO PESOS 48/100 M.N.)

SUBTOTAL
IVA
TOTAL

\$	118,797.83
\$	19,007.65
\$	137,805.48



RESUMEN DE ESTIMACION

PROGRAMA: 0	CONTRATO No. CEDH 001/2021	CONTRATADOS INCLUYE CONVENIO
OBRA: TERMINACION DE LA OBRA RELATIVA A LA REMODELACION INTERIOR PARA OFICINAS DE LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN CHIHUAHUA CHIHUAHUA	ESTIMACIÓN No. 5 (CINCO)	\$ 931,894.49 CON IVA
MUNICIPIO: CHIHUAHUA CHIHUAHUA	PERÍODO EJEC. 20 DE AGOSTO DEL 2021 AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	
CONTRATISTA: ING RAFAEL AMAYA TORAL	IMPORTE ESTIMADO (CON IVA)	\$ 137,805.48 CON IVA
RFC AATR 640214 AS0	ACUMULADO ANTERIOR (CON IVA)	\$ 684,557.64 CON IVA
	IMPORTE ACUMULADO (CON IVA)	\$ 931,892.33 CON IVA

TIPO DE OBRA	IMPORTE	OBSERVACIONES
<u>NORMALES</u>	\$ 118,797.83	
<u>EXEDENTES</u>	\$ -	
<u>EXTRAORDINARIOS</u>	\$ -	
IMPORTE TOTAL ESTIMACION (SIN IVA)	\$ 118,797.83	

DESCUENTOS

SEC. FUN. PUB. DEL 0.5% \$ 0.00

\$

SUMA DESCUENTOS \$ 0.00

RESUMEN

SUMA ESTA ESTIMACION \$ 118,797.83

AMORT ANTICIPO \$ 0.00

SUB-TOTAL \$ 118,797.83

I.V.A. \$ 19,007.65

TOTAL \$ 137,805.48

(CON LETRA)

(CIENTO TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCO PESOS 48/100 M.N.)

DESCUENTOS \$ 0.00

SALDO NETO A RECIBIR \$ 137,805.48

AUTORIZO

ELABORO

C.P. RAFAEL VALENZUELA LICÓN

SUPERVISOR DE OBRA

ING RAFAEL AMAYA TORAL

CONTRATISTA

C.P. RAFAEL VALENZUELA LICÓN, PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE LA COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

CHIHUAHUA, CHIH.,

20 DE AGOSTO DEL 2021

RECIBIMOS DE LA COMISION DE LOS DERECHOS HUMANOS, LA CANTIDAD DE:
(CIENTO TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCO PESOS 48/100 M.N.)

\$ 137,805.48

ESTIMACIÓN NUM. 5 (CINCO)
0.00

CONTRATO No. CEDH 001/2021

POR LA CANTIDAD DE : \$ 931,894.49

COMO PAGO A LA

INCLUYE CONVENIO

POR TRABAJOS EN LA OBRA:

TERMINACION DE LA OBRA RELATIVA A LA REMODELACION INTERIOR PARA OFICINAS DE LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN CHIHUAHUA

ALCANCE DE LA ESTIMACION \$ 118,797.83

AMORTIZACION DEL ANTICIPO \$ -

SUBTOTAL \$ 118,797.83

IVA \$ 19,007.65

TOTAL \$ 137,805.48

RETENCIONES PACTADA EN CONTRATO

SEC. FUN. PUB. DEL 0.5%

0.00

SUMA 0.00

RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA

1.- CONTRATO (MONTOS CON IVA)

IMPORTE CONTRATADO
CONVENIO MODIFICATORIO
ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR
ESTA ESTIMACION
ACUMULADO HASTA EST ESTIMACION
POR EJERCER

CONTRATO

\$ 931,894.49
\$ -
\$ 794,086.86
\$ 137,805.48
\$ 931,892.33
\$ 2.13

2.- AMORTIZACION DEL ANTICIPO (MONTOS CON IVA)

IMPORTE DE ANTICIPO
ACUMULADO ANTERIOR
AMORT. EN ESTA ESTIMACION
ACUMULADO ACTUAL
POR AMORTIZAR

CONTRATO

\$ 158,357.36
\$ 158,357.36
\$ -
\$ 158,357.36
\$ (0.00)

3.- RETENCIONES PACTADAS EN CONTRATO

ACUMULADO ANTERIOR
ESTA ESTIMACION
ACUMULADO ACTUAL

\$ -
\$ -
\$ -

R E C I B I M O S

ING RAFAEL AMAYA TORAL
AATR 640214 AS0

OBRA: TERMINACION DE LA OBRA RELATIVA A LA REMODELACION INTERIOR
PARA OFICINAS DE LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN
CHIHUAHUA CHIHUAHUA
CONTRATIST: ING RAFAEL AMAYA TORAL

MUNICIPIO: CHIHUAHUA CHIHU No. CONTRATO: CEDH 001/2021
ESTIMACIÓN No. 5 (CINCO)
PERIODO: 20 DE AGOSTO DEL 2021 AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

RESUMEN DE LA ESTIMACIÓN POR PARTIDAS		
No.	DESCRIPCION DE LAS PARTIDAS	IMPORTE

NORMALES

118,797.83

EXCEDENTES

0.00

EXTRAORDINARIOS

0.00

SUBTOTAL	118,797.83
I.V.A.	19,007.65
TOTAL	137,805.48

POR EL CONTRATISTA

ING. RAFAEL AMAYA TORAL

POR LA COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

C.P. RAFAEL VALENZUELA LICO

OBRA: TERMINACION DE LA OBRA RELATIVA A LA REMODELACION INTERIOR PARA OFICINAS DE LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN CHIHUAHUA CHIHUAHUA

CONTRATISTA: ING RAFAEL AMAYA TORAL

MUNICIPIO: CHIHUAHUA CHIHUAHUA No. CONTRATO: CEDH 001/2021
ESTIMACION No. 5 (CINCO)
PERIODO: 20 DE AGOSTO DEL 2021 AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

CONCEPTOS		PROYECTO		VOLUMENES		PRECIO UNITARIO	IMPORTE
No.	DESCRIPCION	UNIDAD	VOLUMEN	ACUM. TOTAL	IM. ANTERIOR		
PRESUPUESTO REMODELACION OFICINAS CEDH							
NORMAL							

6110 707 02

1.00	PREFINIMARES										\$118,797.83
1.05	Excavacion de 15 cm a mano en terreno tipo "b" para	m3	12.04	12.04	5.04	7.00				\$261.77	\$1,832.39
1.06	Retiro de escombros producto de excavaciones,	m3	56.00	14.00	0.00	14.00				\$383.04	\$5,362.56
1.07	Suministro y colocacion de columna de pñr de 4" x 4" bco,	pza	1.00	1.00	0.00	1.00				\$5,007.35	\$5,007.35
2.00	ALBAÑILERIA										\$218.63
	Suministro y colocacion de flotador y viavula de llenado en aljibe y arreglo de fuga en pichancha de hidroneumatico, incluye materiales mano de obra y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	lote	1.00	1.00	0.00	1.00				1198.26	\$1,198.26
2.12	Construccion de muro arriba de muro de acometida en barandal de fachada principal a base de muro de block de 20x20x40 incluye aplastado mortero cemento arena 1:4 y pintura.	pza	1.00	1.00	0.00	1.00				2020.37	\$2,020.37
2.13	CANCELERIA										\$1,798.50
4.00	Suministro y aplicacion de pintura en puerta barandal existente, incluye suministro de bisagras de cilindro, soldadura, materiales, equipo mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	lote	1.00	1.00	0.00	1.00				\$1,798.50	\$1,798.50
5.00	AREA DE BAÑOS										\$7,417.34
5.02	Suministro y colocacion de dispensador de jabon liquido para manos marca tofel modelo altaña grande ec70000	pza	6.00	6.00	4.00	2.00				\$1,208.23	\$2,412.46
5.03	Suministro y colocacion de dispensador de papel para manos marca tofel modelo altera pr72010	pza	6.00	6.00	4.00	2.00				\$1,964.32	\$3,928.64
5.16	Colocacion de sanitario existente incluye guia y todo lo necesario para su correcta colocacion	pza	2.00	2.00	1.00	1.00				\$776.24	\$776.24
6.00	SEÑALIZACION Y SEGURIDAD										\$14,114.78
6.04	Pintura Blanca sobre concreto para delimitar cajones de estacionamiento de 15 cms de espesor en cedit actual	ml	44.00	44.00	0.00	44.00				\$85.18	\$3,747.92
6.05	Siministro y colocacion de detector de humo de baterias inalámbrico first alert mod. 5a303cr3	pza	15.00	15.00	5.00	10.00				\$806.61	\$8,066.10
6.11	Fabricacion y colocacion de bolardo para proteccion de motor de puerta corrediza a base de pñr de 4"x4" y ands de varilla incluye pintura de esmalte anticorrosivo.	pza	1.00	1.00	0.00	1.00				\$1,739.06	\$1,739.06
6.12	Rehabilitacion de tope de estacionamiento, incluye herramienta, equipo, mano de obra y lo necesario para su correcta reubicacion y funcionamiento.	pza	1.00	1.00	0.00	1.00				\$561.70	\$561.70
7.00	ELECTRICO										\$19,613.80

OBRA: TERMINACION DE LA OBRA RELATIVA A LA REMODELACION INTERIOR PARA OFICINAS DE LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN CHIHUAHUA CHIHUAHUA

MUNICIPIO: CHIHUAHUA CHIHUAHUA

No. CONTRATO: CEDH 001/2021

CONTRATISTA:

ING RAFAEL AMAYA TORAL

PERIODO:

ESTIMACION No. 20 DE AGOSTO DEL 2021 AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

No.	CONCEPTOS		PROYECTO		ACUM. TOTAL		VOL. ESTIMADO		PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	DESCRIPCION	UNIDAD	VOLUMEN							
7.03	Reubicacion de tomacorriente en sala de juntas, incluye cable, tomacorriente, chaluipa, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	sal	4.00	4.00	0.00	4.00		\$861.88	\$	3,447.52
7.04	Suministro y colocacion de candil colgante decorativo led 20 w oscula luz blanca	pza	3.00	3.00	0.00	3.00		\$5,388.76	\$	16,166.28
8.00	CARPINTERIA									60,732.48
8.03	Manchado y repintado de puertas con vidrio y columnas, reparaciones de carpinteria, vaguetas.	m2	83.86	83.86	53.00	30.86		\$1,968.00	\$	60,732.48

POR EL
ING. RA
CONTRATISTA
AMAYA TORAL



GENERADOR VOLUMEN DE OBRA PARA ESTIMACIÓN

OBRA:	NO. DE ESTIMACION	5
TERMINACION DE LA OBRA RELATIVA A LA REMODELACION INTERIOR PARA OFICINAS DE LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN CHIHUAHUA		

PERIODO: 20 DE AGOSTO AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

[illegible]



GENERADOR VOLUMEN DE OBRA PARA ESTIMACIÓN

OBRA:
TEMA: REFORMA DE LA OBRA
RELATIVA A LA REMODELACION
INTERIOR PARA OFICINAS DE LA
COMISION ESTATAL DE DERECHOS
HUMANOS EN CHIHUAHUA

NO. DE ESTIMACION 5

NO. DE ESTIMACION 5

PERIODO: 20 DE AGOSTO AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

[illegible]



GENERADOR VOLUMEN DE OBRA PARA ESTIMACIÓN

OBRA:
**TERMINACION DE LA OBRA
RELATIVA A LA REMODELACION
INTERIOR PARA OFICINAS DE LA
COMISION ESTATAL DE DERECHOS
HUMANOS EN CHIHUAHUA**

NO. DE ESTIMACION 5

NO. DE ESTIMACION 5

PERIODO: 20 DE AGOSTO AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

[illegible]



GENERADOR VOLUMEN DE OBRA PARA ESTIMACIÓN

OBRA:
TERMINACION DE LA OBRA
RELATIVA A LA REMODELACION
INTERIOR PARA OFICINAS DE LA
COMISION ESTATAL DE DERECHOS
HUMANOS EN CHIHUAHUA

5
NO. DE ESTIMACION

5

PERIODO: 20 DE AGOSTO AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

[illegible]



GENERADOR VOLUMEN DE OBRA PARA ESTIMACIÓN

OBRA:
'TERMINACION DE LA OBRA
RELATIVA A LA REMODELACION
INTERIOR PARA OFICINAS DE LA
COMISION ESTATAL DE DERECHOS
HUMANOS EN CHIHUAHUA

NO. DE ESTIMACION	5
-------------------	---



PERIODO: 20 DE AGOSTO AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

[illegible]



GENERADOR VOLUMEN DE OBRA PARA ESTIMACIÓN

**OBRA:
TERMINACION DE LA OBRA
RELATIVA A LA REMODELACION
INTERIOR PARA OFICINAS DE LA
COMISION ESTATAL DE DERECHOS
HUMANOS EN CHIHUAHUA**

NO. DE ESTIMACION	5
-------------------	---

5

PERIODO: 20 DE AGOSTO AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021


[illegible]



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

GENERADOR VOLUMEN DE OBRA PARA ESTIMACIÓN

OBRA:		TERMINACION DE LA OBRA		NO. DE ESTIMACION		5		PERIODO: 20 DE AGOSTO AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021			
		RELATIVA A LA REMODELACION									
		INTERIOR PARA OFICINAS DE LA									
		COMISION ESTATAL DE DERECHOS									
		HUMANOS EN CHIHUAHUA									
		CHIHUAHUA									
clave	5.02	Concepto	ele	tramo	pza.	unidad	Largo	Ancho	Alto	PIEZA	
		suministro y colocacion de dispensador de jabon liquido para manos marca Lofel modelo			2					2	



GENERADOR VOLUMEN DE OBRA PARA ESTIMACIÓN

**TERMINACION DE LA UBICACION
RELATIVA A LA REMODELACION
INTERIOR PARA OFICINAS DE LA
COMISION ESTATAL DE DERECHOS
HUMANOS EN CHIHUAHUA**

NO. DE ESTIMACION 5

PERIODO: 20 DE AGOSTO AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

[illegible]



GENERADOR VOLUMEN DE OBRA PARA ESTIMACIÓN

OBRA:
TERMINACION DE LA OBRA
RELATIVA A LA REMODELACION
INTERIOR PARA OFICINAS DE LA
COMISION ESTATAL DE DERECHOS
HUMANOS EN CHIHUAHUA

NO. DE ESTIMACION	5
-------------------	---

5

PERIODO: 20 DE AGOSTO AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

[illegible]

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

GENERADOR VOLUMEN DE OBRA PARA ESTIMACIÓN

OBRA:
TERMINACION DE LA OBRA
RELATIVA A LA REMODELACION
INTERIOR PARA OFICINAS DE LA
COMISION ESTATAL DE DERECHOS
HUMANOS EN CHIHUAHUA

NO. DE ESTIMACION 5

PERIODO: 20 DE AGOSTO AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

[illegible]



GENERADOR VOLUMEN DE OBRA PARA ESTIMACIÓN

**OBRA:
TERMINACION DE LA OBRA
RELATIVA A LA REMODELACION
INTERIOR PARA OFICINAS DE LA
COMISION ESTATAL DE DERECHOS
HUMANOS EN CHIHUAHUA**

NO. DE ESTIMACION	5
-------------------	---

4

PERIODO: 20 DE AGOSTO AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

[illegible]



GENERADOR VOLUMEN DE OBRA PARA ESTIMACIÓN

OBRA:
**TERMINACION DE LA OBRA
RELATIVA A LA REMODELACION
INTERIOR PARA OFICINAS DE LA
COMISION ESTATAL DE DERECHOS
HUMANOS EN CHIHUAHUA**

NO. DE ESTIMACION 5

PERIODO: 20 DE AGOSTO AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

[illegible]



GENERADOR VOLUMEN DE OBRA PARA ESTIMACIÓN

OBRA:
'ELIMINACION DE LA OBRA
RELATIVA A LA REMODELACION
INTERIOR PARA OFICINAS DE LA
COMISION ESTATAL DE DERECHOS
HUMANOS EN CHIHUAHUA

NO. DE ESTIMACION 5

5

PERIODO: 20 DE AGOSTO AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021


[illegible]



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

GENERADOR VOLUMEN DE OBRA PARA ESTIMACIÓN

OBRA:		TERMINACION DE LA OBRA		NO. DE ESTIMACION		PERIODO: 20 DE AGOSTO AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021													
		RELATIVA A LA REMODELACION		5															
		INTERIOR PARA OFICINAS DE LA																	
		COMISION ESTATAL DE DERECHOS																	
		HUMANOS EN CHIHUAHUA																	
		CHIHUAHUA																	
clave	Concepto	eje	tramo	pza.	unidad	Largo	Ancho	Alto	SAL										
7.03	Reubicacion de tomacorriente en sala de juntas, incluye cable, tomacorriente, chalupe, herramienta, mano de obra				4				4										
					</														



GENERADOR VOLUMEN DE OBRA PARA ESTIMACIÓN

OBRA:
TERMINACION DE LA OBRA
RELATIVA A LA REMODELACION
INTERIOR PARA OFICINAS DE LA
COMISION ESTATAL DE DERECHOS
HUMANOS EN CHIHUAHUA

NO. DE ESTIMACION 5

PERIODO: 20 DE AGOSTO AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

[illegible]



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

GENERADOR VOLUMEN DE OBRA PARA ESTIMACIÓN

OBRA:		TERMINACION DE LA OBRA		NO. DE ESTIMACION		5		PERIODO: 20 DE AGOSTO AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021					
		RELATIVA A LA REMODELACION											
		INTERIOR PARA OFICINAS DE LA											
		COMISION ESTATAL DE DERECHOS											
		HUMANOS EN CHIHUAHUA											
clave	Concepto	eje	tramo	pza.	unidad	Largo	Ancho	Alto	M2				
8.03	Manchado y repintado de puertas con vidrio y columnas, reparaciones de carpinteria, vogueles	planta		6		2.05	0.4		4.92				
		baja		2		1.45	0.4		1.16				
				6		1.85	0.4		4.44				
				2		2.3	0.4		1.84				
			7		2	0.4		6.60					
			2		3.34	0.4		2.67					
			7		2	0.4		6.60					
			2		3.34	0.4		2.67					
			5		1.91	0.4		3.82					
			2		1.49	0.4		1.19					
		dintel 1	2		1.48	0.57		1.69					
		dintel 2	2		1.08	0.57		1.23					
		rodaple	4		3.34	0.35		4.68					
		planta alta											




COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS



REPORTE FOTOGRAFICO

OBRA:


TERMINACION DE LA OBRA RELATIVA A LA REMODELACION INTERIOR
PARA OFICINAS DE LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN
CHIHUAHUA CHIHUAHUA

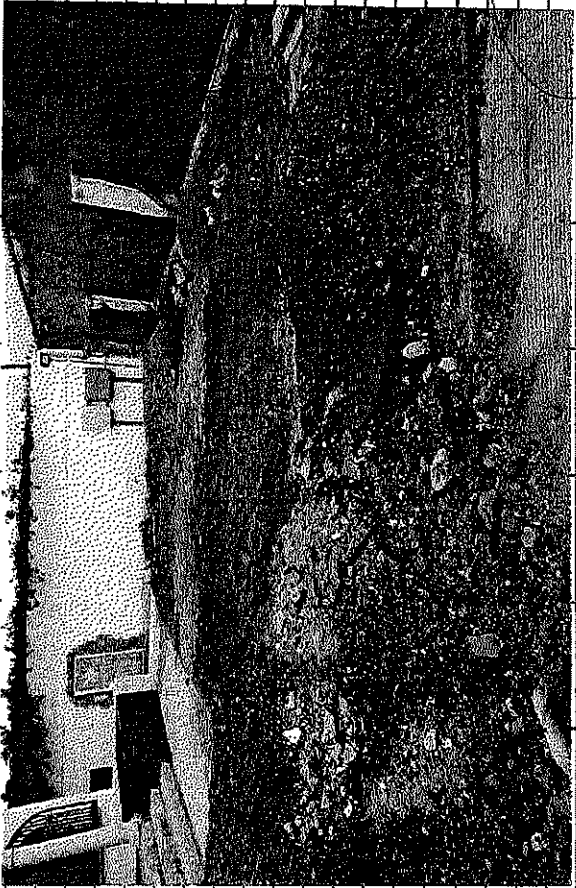clave	Concepto
	Excavacion de 15 cm a mano en terreno tipo "b" para habilitado de cajones de estacionamiento 

clave		Concepto	
		Refiro de escombros producto de excavaciones, demoliciones, hierba, desperdicios y de retiros de aplanados fuera de obra.	

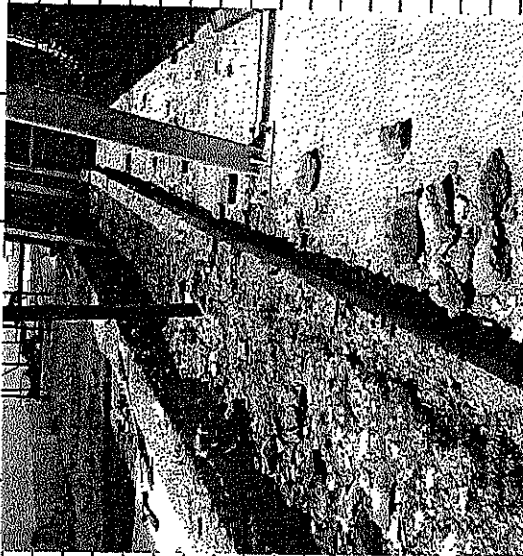



Handwritten signature and scribbles.

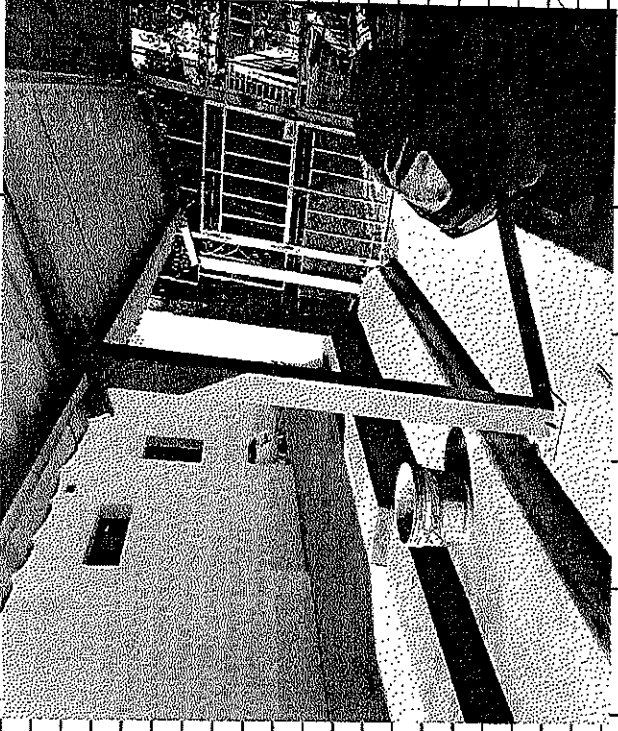
clave	Concepto
	Suministro y colocación de columna de pte. de 4" x 4" bco, en techumbre de lamina en estacionamiento existente, incluye placa de 20x20x1/4", anclaje, soldadura, pintura de esmalte anticorrosiva, herramienta, equipo así como todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento. 

clave

Concepto

Suministro y colocación de flotador y viavula de llenado en aljibe y arreglo de fuga en pichiancha de hidroneumático, incluye materiales mano de obra y todo lo necesario para su correcto funcionamiento

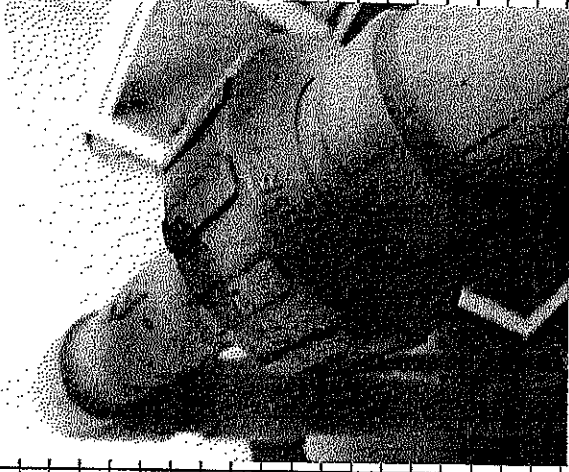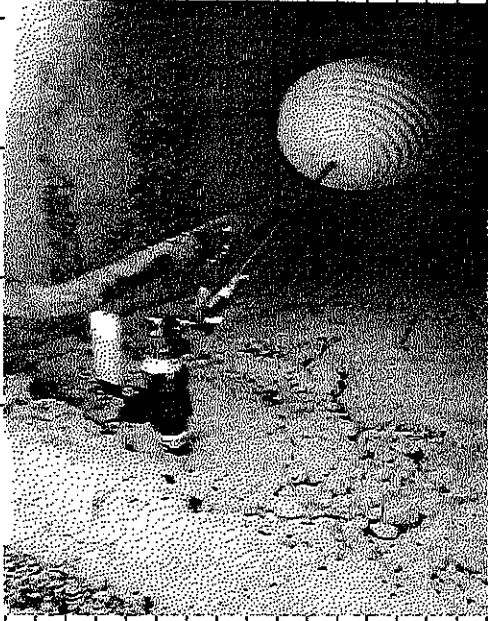


clave	Concepto
	Construcion de muro arriba de muro de acometida en barandal de fachada principal, a base de muro de block de 20x20x40 incluye aplamado mortero cemento arena 1:4 y pintura. 

Handwritten scribbles and lines, possibly indicating a signature or initials, located in the upper right corner of the page.

clave

Concepto



Suministro y aplicación de pintura en puerta barandal existente, incluye suministro de bisagras de cilindro, soldadura, materiales, equipo mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.





clave

Concepto

Suministro y colocacion de dispensador de jabon liquido para manos marca Jofel modelo altana grande
ac70000

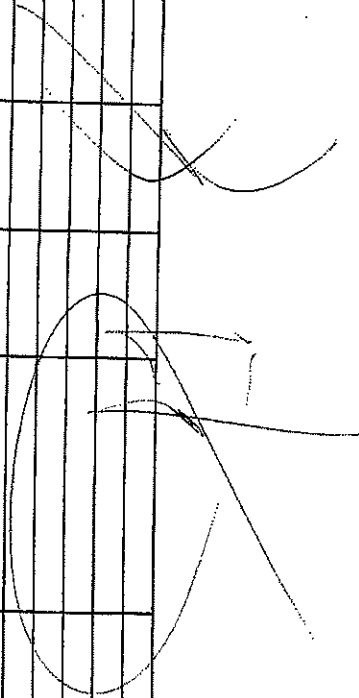

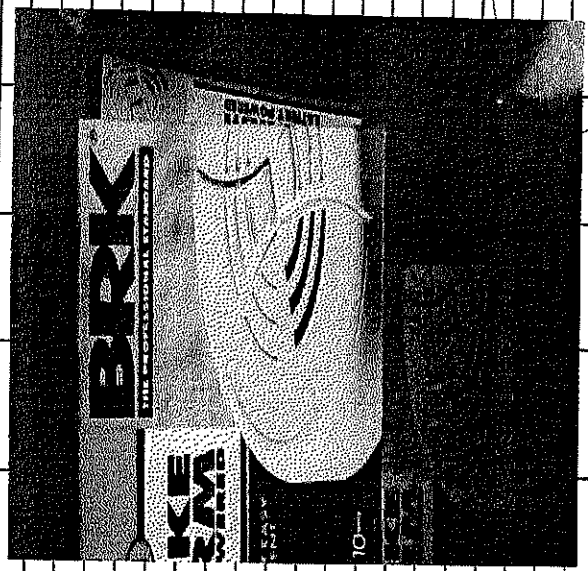
clave		Concepto	
		Siministro y colocacion de detector de humo de baterias inalambrico first alert mod. Sa303cr3	



clave

Concepto

Fabricación y colocación de bolaro para protección de motor de puerta corredera a base de pfr de 4"x4" y anclis de varilla incluye piniura de esmalte anticorrosiva.

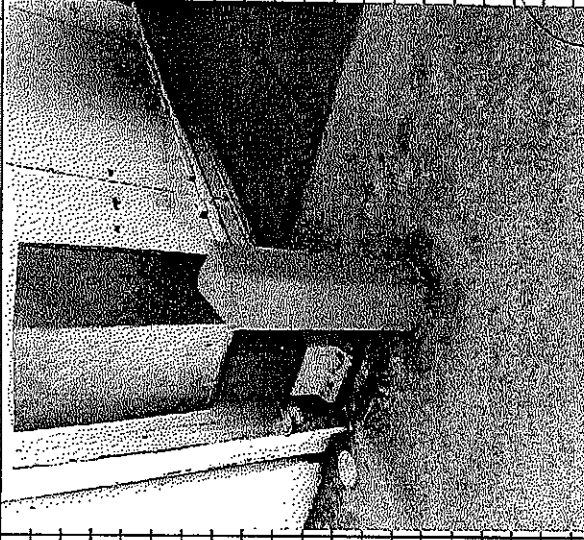



Handwritten signature and initials.

clave	Concepto										
	Rehubicacion de tope de estacionamiento, incluye herramienta, equipo, mano de obra y lo necesario para su correcta reubicacion y funcionamiento.										



Handwritten signature or initials in the right margin of the table.

clave	Concepto
	Reubicación de tomacorriente en sala de Juntas, incluye cable, tomacorriente, chataupa, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

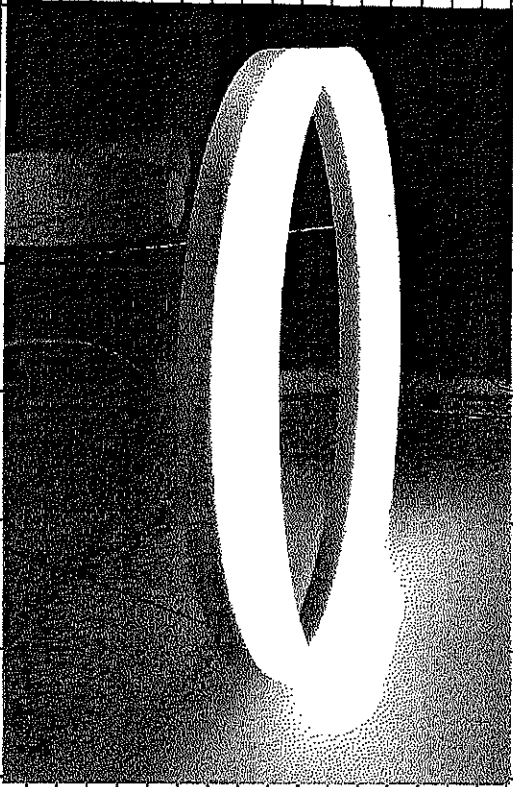clave	Concepto
	Suministro y colocación de candelabro decorativo led 20 w osqula luz blanca 

clave	Concepto
	Manchado y replintado de puertas con vidrio y columnas, reparaciones de carpinteria, vaguetas. 
