



CEDH

COMISIÓN ESTATAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS CHIHUAHUA

ANEXO No. 9

Fecha 9/07/2021

Folio N° /Anexo N°

Con esta fecha se da apertura a la presente bitácora con el fin de anotar todos los asuntos técnicos y administrativos que se generen durante la obra de Terminación de la obra relativa a la Remodelación interior para las oficinas de la Comisión estatal de Derechos Humanos en Chihuahua, Chihuahua, que al amparo del Contrato No. CDEH 001/2021 será ejecutado por la compañía "Rafael Amaya Toral".

Con un importe \$931,894.49, IVA incluido y un periodo de ejecución de 63 días naturales iniciando el 9 de julio del 2021.

El domicilio que da el contratista es, calle pino No. 509 Interior 5 col. granjas de la Cdy de Chihuahua, Chihuahua.

La CDEH nombra como superintendente de obra al C.P. Rafael Valenzuela Licón autorizándolo para realizar anotaciones y suscribir las mismas.

Y por parte de la contratista nombra como residente de obra al Ing. Rafael Amaya Toral, autorizándolo para realizar anotaciones y suscribir las mismas en esta bitácora.


Se registran las siguientes firmas:

Por la dependencia:



Superintendente de Obra

Por la Contratista:



Residente de Obra.

Elaborado por:

Recibido por:

Fecha 9/07/2021

Folio N° /Anexo N°

Con esta fecha se establece lo siguiente:

- 1.- La presente bitácora permanecerá en el sitio de la Obra para consultar y asentar notas diariamente en un horario de las 8:00 am a las 6:00 p.m.
- 2.- Una vez asentada una nota la contratante está obligada a firmar en un plazo no mayor a 72 hrs en caso contrario se clara por asentado el contenido de la misma.
- 3.- Una vez asentada y firmada la nota, esta no podrá ser modificada ni por el responsable que la realizó.
- 4.- La Obligación de ambas partes es asentar en la bitácora los aspectos relativos a la revisión y autorización de estimaciones, números generadores, cantidades adicionales o conceptos no previstos en el contrato, así como lo necesario a las normas de seguridad e higiene y protección al ambiente que deberán implementarse.
- 5.- Se asienta en esta bitácora que no se pagaran conceptos extraordinarios, ni cantidades adicionales de volumen a los contratos no autorizados en esta bitácora.

Elaborado por:

Recibido por:

Fecha 12/07/2021

Folio N° / Anexo N°

Nota No. 1

Con esta fecha se informa que se inicia con excavación en Area de estacionamiento frontal

Con esta fecha se informa que se comienza con yeso muestreado en area de sotano

Con esta fecha se informa que se comienza con zanja en area de porton de entrada para cableado de intercomunicador

Elaborado por:

Recibido por:

Fecha 13/07/2021

Folio N° /Anexo N°


NOTA No. 2

Con esta fecha se informa que se comienza a trabajar en muro de borda perimetral, áreas sueltas.

Con esta fecha se informa que se continuará con aplicación de yeso en sótano.

Con esta fecha se informa que se desmonta reja existente en ventana, quella pendiente arreglo de enjarre,

Se informa que se comienza la pintura de herrería existente color negro.

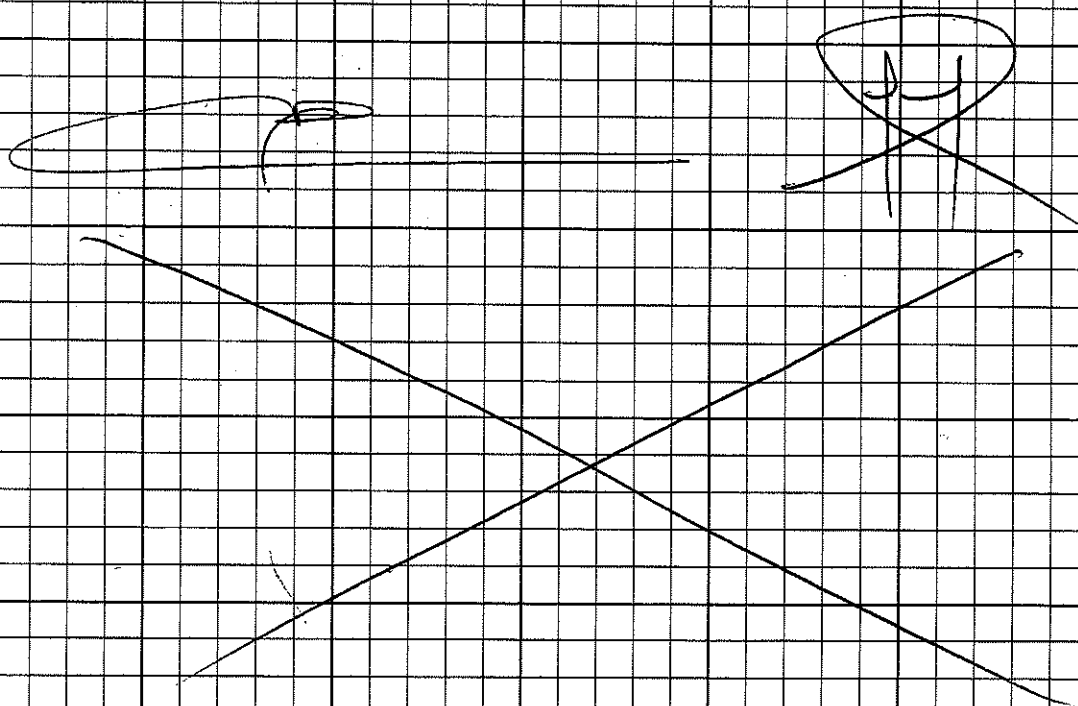

Elaborado por:

Recibido por:

Fecha 15/07/2021


Folio N° /Anexo N°

NOTA No. 3

Con esta fecha se informa que se comienza con
ajustado en borda perimetral.

Con esta fecha se informa que se comienzan
a instalar letreros de seguridad de acrílico
según ubicación de plano.

Con esta fecha se informa que se comenzó
a instalar los extintores recargables.



Elaborado por:

Recibido por:

Fecha 17/07/2021

Folio N° /Anexo N°

NOTA No. 4

Con esta fecha se informa que se desmonta zócalo existente, para aplicación de mancha del mismo

Con esta fecha se informa que se continúe con empuje de barda perimetral así como retiro de arcos sueltas.

Con esta fecha se informa de la colocación de detectores de humo según plano.

Con esta fecha se informa de la colocación de lámparas de emergencia tipo micky.

Con esta fecha se informa que se comienza con la instalación eléctrica del sótano.

Con esta fecha se informa que se comienza con la instalación de topes de estacionamiento.

Con esta fecha se informa que se desmontaron puerta principal y de empleados para su rehabilitación.

Elaborado por:

Recibido por:

Fecha 18 / 07 / 2021

Folio N° / Anexo N°


NOTA No. 5

Con esta fecha se informa que se comienza con lijado y raspado de puertas, vidrio y columnas.

Se informa que se continúan con enjarres de barda perimetral, y pintura de la misma.

Con esta fecha se informa que se continúa con yeso en área de sótano.

Con esta fecha se informa que se comienza con la instalación de topo de estacionamiento.



Elaborado por:

Recibido por:

Fecha 20 / 07 / 2021

Folio N° / Anexo N°

NOTA NO-0

Con esta fecha se informa que se continuará con enjarre en banda perimetral, así como pintura.

Con esta fecha se informa que se continuará con yeso en área de estano.


Con esta fecha se informa que se continuará con pintura en herrería.

Con esta fecha se informa que se continuará con colocación de topes de estacionamiento.

Con esta fecha se informa de desmantelamiento y retiro de la caldera.

Con esta fecha se informa de colado de cajones de estacionamiento de parte frontal.

Con esta fecha se informa en la colocación de block en área de banda perimetral según plano.

A handwritten signature is written on the left, followed by a horizontal line pointing to a circular stamp on the right. The stamp contains the letters 'J' and 'R' and is crossed out with a large 'X'.

Elaborado por:

Recibido por:

Fecha 21/10/2021

Folio N° / Anexo N°


Nota No. 7

Con esta fecha se informa que se continúa con aplicación de pintura en banda perimetral y sótano.

Con esta fecha se informa que se comienza con colocación de cerámica de portico y escaleras del área del sótano.

Con esta fecha se comienza con la colocación de dispensador de papel higiénico y dispensador de jabón, y dispensador de papel de manos.

Con esta fecha se informa que se comienza con la instalación eléctrica en sótano.



Elaborado por:

Recibido por:

Fecha 25/07/2021



Folio N° /Anexo N°

Nota. No. 8

Con esta fecha se informa que se termino la instalacion electrica en area de sotano.

Con esta fecha se informa que se continuara con pintura en Borda perimetral

Con esta fecha se informa que se termino de instalar topes de estacionamiento.



Elaborado por:

Recibido por:

Fecha 2 / 8 / 2021

Folio N° / Anexo N°


Nota nro. 9

Con esta fecha se informa que se reubica tanque de gas.

Con esta fecha se informa que se comienza con la demolición de la banda

Con esta fecha se informa que se comienza con la instalación de rampa de discapacitados

Con esta fecha se informa que se pintan puntos de reunión es estacionamiento



Elaborado por:

Recibido por:

Fecha 6 / 08 / 2021


Folio N° / Anexo N°

NOTA No. 10

Con esta fecha se informa que se realiza conexión de drenaje de CDEH oficinas de capacitación a registro de CDEH (arroyo nueva).

Con esta fecha se informa que se continúa con demolición de barda.


Con esta fecha se informa que se continúa con el retiro de escombros de obra.



8 / 08 / 2021

NOTA No. 11

Con esta fecha se informa retiro de rampa de minusválidos.



Elaborado por:

Recibido por:

Fecha 10/08/2021

Folio N° /Anexo N°



NOTA No.-12

Con esta fecha se informa de sacado de firme de concreto en area de escalones.

Con esta fecha se informa rehabilitacion de bases de pilares de cantera.

Con esta fecha se informa reubicacion de dren salida de minisplit.

Con esta fecha se informa reubicacion de salida de termostatos a peticion de Arq. Tellez.





13/08/2021

Nota No.-13

Con esta fecha se informa la colocacion de yeso en el sotano en cuartito faltante.

Con esta fecha se informa de aplicacion de pintura en el area del sotano y area faltante.



Elaborado por:

Recibido por:

Fecha 14/08/2021

Folio N°

/Anexo N°



NOTA No. 14

Con esta fecha se informa la colocación del cancel para el site

Con esta fecha se informa recorte de ventaneros, de herrería, quedando pegadas al marco de carpentería.

Con esta fecha se informa adecuación e instalación de puerta para acceso de personas minusválidas y fijo

Con esta fecha se informa que se reubicaron reflectores del área de estacionamiento.





15/08/2021

NOTA No. 15

Con esta fecha se informa que se retiraron minijtorios y tornos de baño en adecuación de baño de minusválidos.

Con esta fecha se informa que se retiraron mamparas en adecuación de baño de minusválidos



Elaborado por:


Recibido por:

Fecha 16 / 08 / 2021

Folio N° / Anexo N°

NOTA No. 16



Con esta fecha se informa que se retira cerámica y se demuele y muro y piso, para reubicar salidas hidrosanitarias en adecuación de baño de minusválidos.



17/08/2021

NOTA No. 17

Con esta fecha se informa que se instala cerámica en piso de adecuación de baño.



18/08/2021

NOTA No. 18

Con esta fecha se informa colocación de cerámica en muro de baño de adecuación de baño.

Con esta fecha se informa la colocación de muro de tablaroca

Elaborado por:

Recibido por:

Fecha 20/08/2021

Folio N° /Anexo N°

NOTA No. 19



Con esta fecha se informa el acomodo de sanitarios en baño.

Con esta fecha se informa la realización de hueco para plaza de minusválidos.

Con esta fecha se informa la colocación de fluxómetro y barras de taza de baño de minusválidos.

Con esta fecha se informa la colocación de extractor de baño.

Con esta fecha se informa la colocación de señalética en baños (hombres - mujeres).



Elaborado por:

Recibido por:

Fecha 21/08/2021

Folio N° / Anexo N°

NOTA. No. 20



Con esta fecha se informa que se terminan de instalar dispensadores de jabón líquido

Con esta fecha se informa aplicación de pintura en puerta de bodega y bisagras

Con esta fecha se informa que se cubren cubren de block en muro de acometida y se enjauro.



Con esta fecha se corrige falla en aljibe de CDEH se coloca de flotador y válvula de llenado así como fuga en motor de conexión a succión pichancha

Con esta fecha se coloca columna de pvc en larrina de estacionamiento



NOTA. No. 21

Con esta fecha se informa que se aclaran excom-
pro fresa de obra



Elaborado por:

Recibido por:

Fecha 24/08/2021



Folio N° /Anexo N°

NOTA No. 22

Con esta fecha se informa que se termino de instalar columna de ptr y pintarla.

Con esta fecha se informa que se termino de pintar rep y parte.

Con esta fecha se informa que se reubican tomacorrientes de sala de juntas



26/08/2021

NOTA No. 23

Con esta fecha se informa que se realizo la reubicación de tope de estacionamiento

Con esta fecha se informa que se colocaron los candiles en sala de juntas, presidencia, apoyo tecnico.

Elaborado por:

Recibido por:

Fecha 28/08/2021


Folio N° /Anexo N°

NOTA No. 24

Con esta fecha se informa que se realizó pintura en líneas de estacionamiento para delimitar cajones.

Con esta fecha se informa que se colocaron detectores de humo faltantes según planos.



Con esta fecha se informa que se terminó de instalar el sumatorio existente en área de capacitación.



4/09/2021

Con esta fecha se informa que se realizó limpieza fina en obra.

Con esta fecha se informa que se realizó limpieza gruesa, sacando todo el escombros de obra, para entrega.



Elaborado por:

Recibido por:
